



QUINTA FASE - Demolizione casette nn. 2, 4 6 e 8 e rimozione lastre di amianto addossate alla recinzione tra la casetta n. 2 e la casetta n. 3 - Area "D" di demolizione

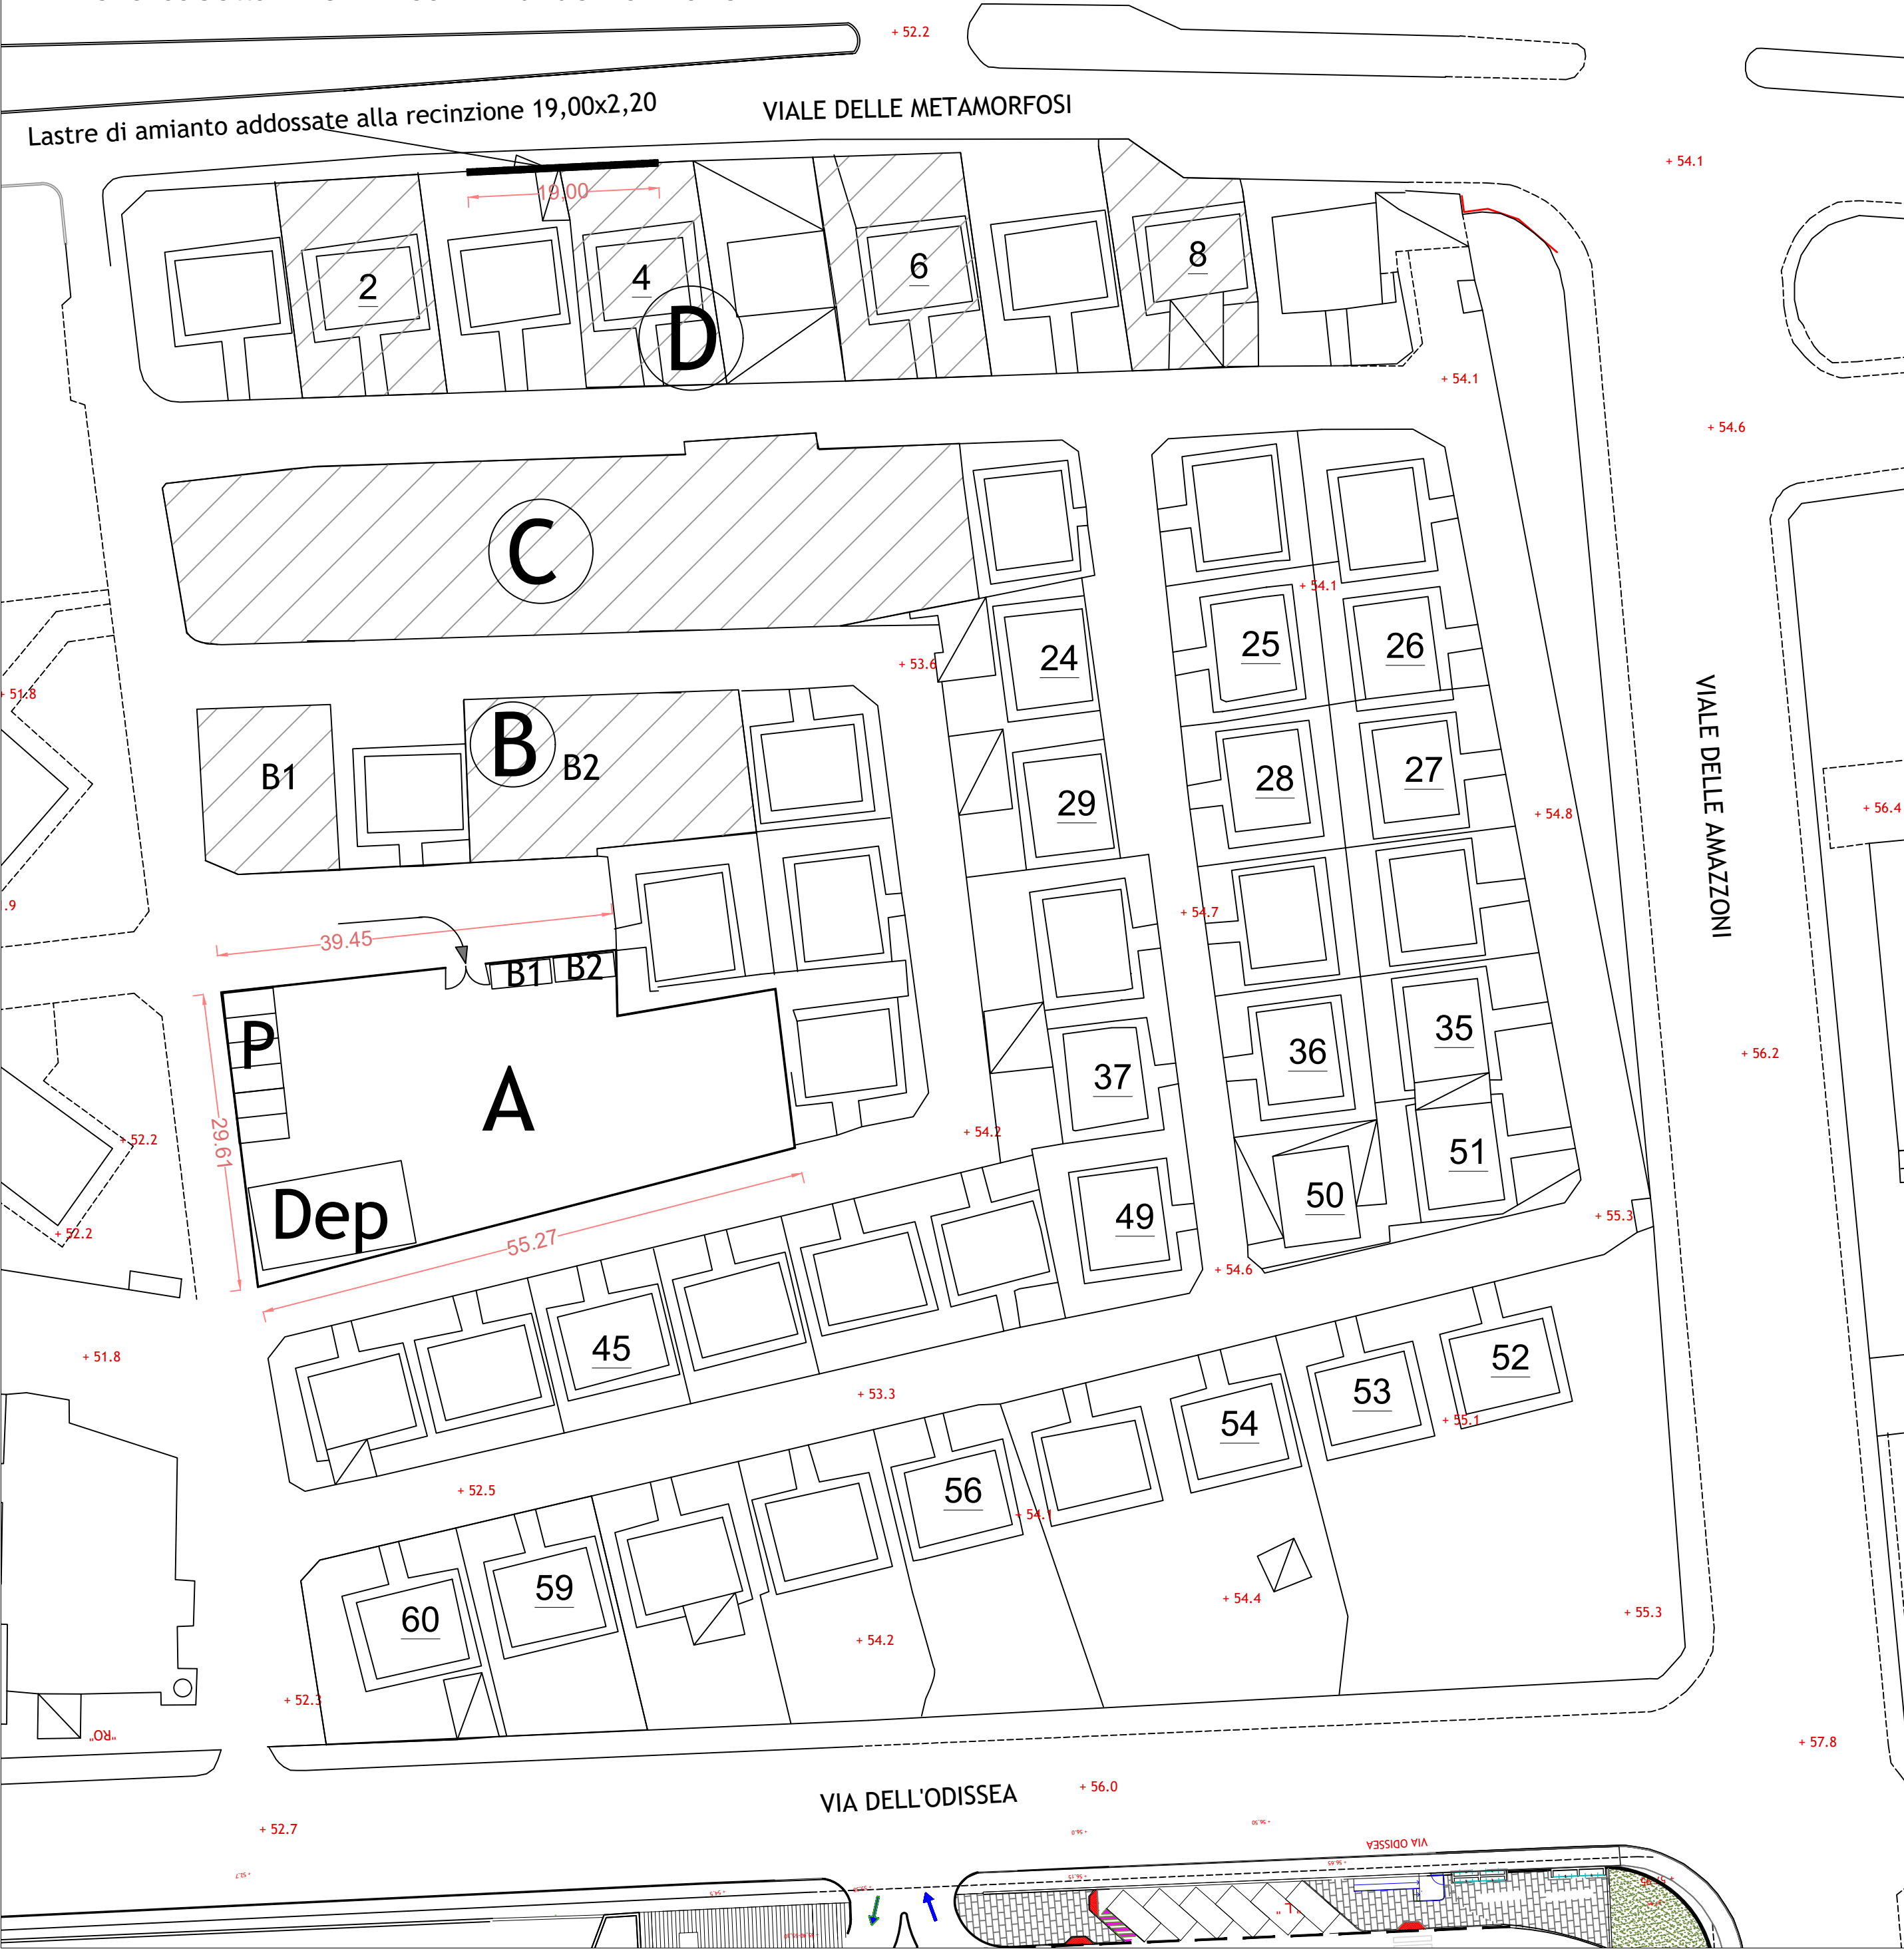

SESTA FASE - Demolizione casetta nn. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 - Area "E" di demolizione

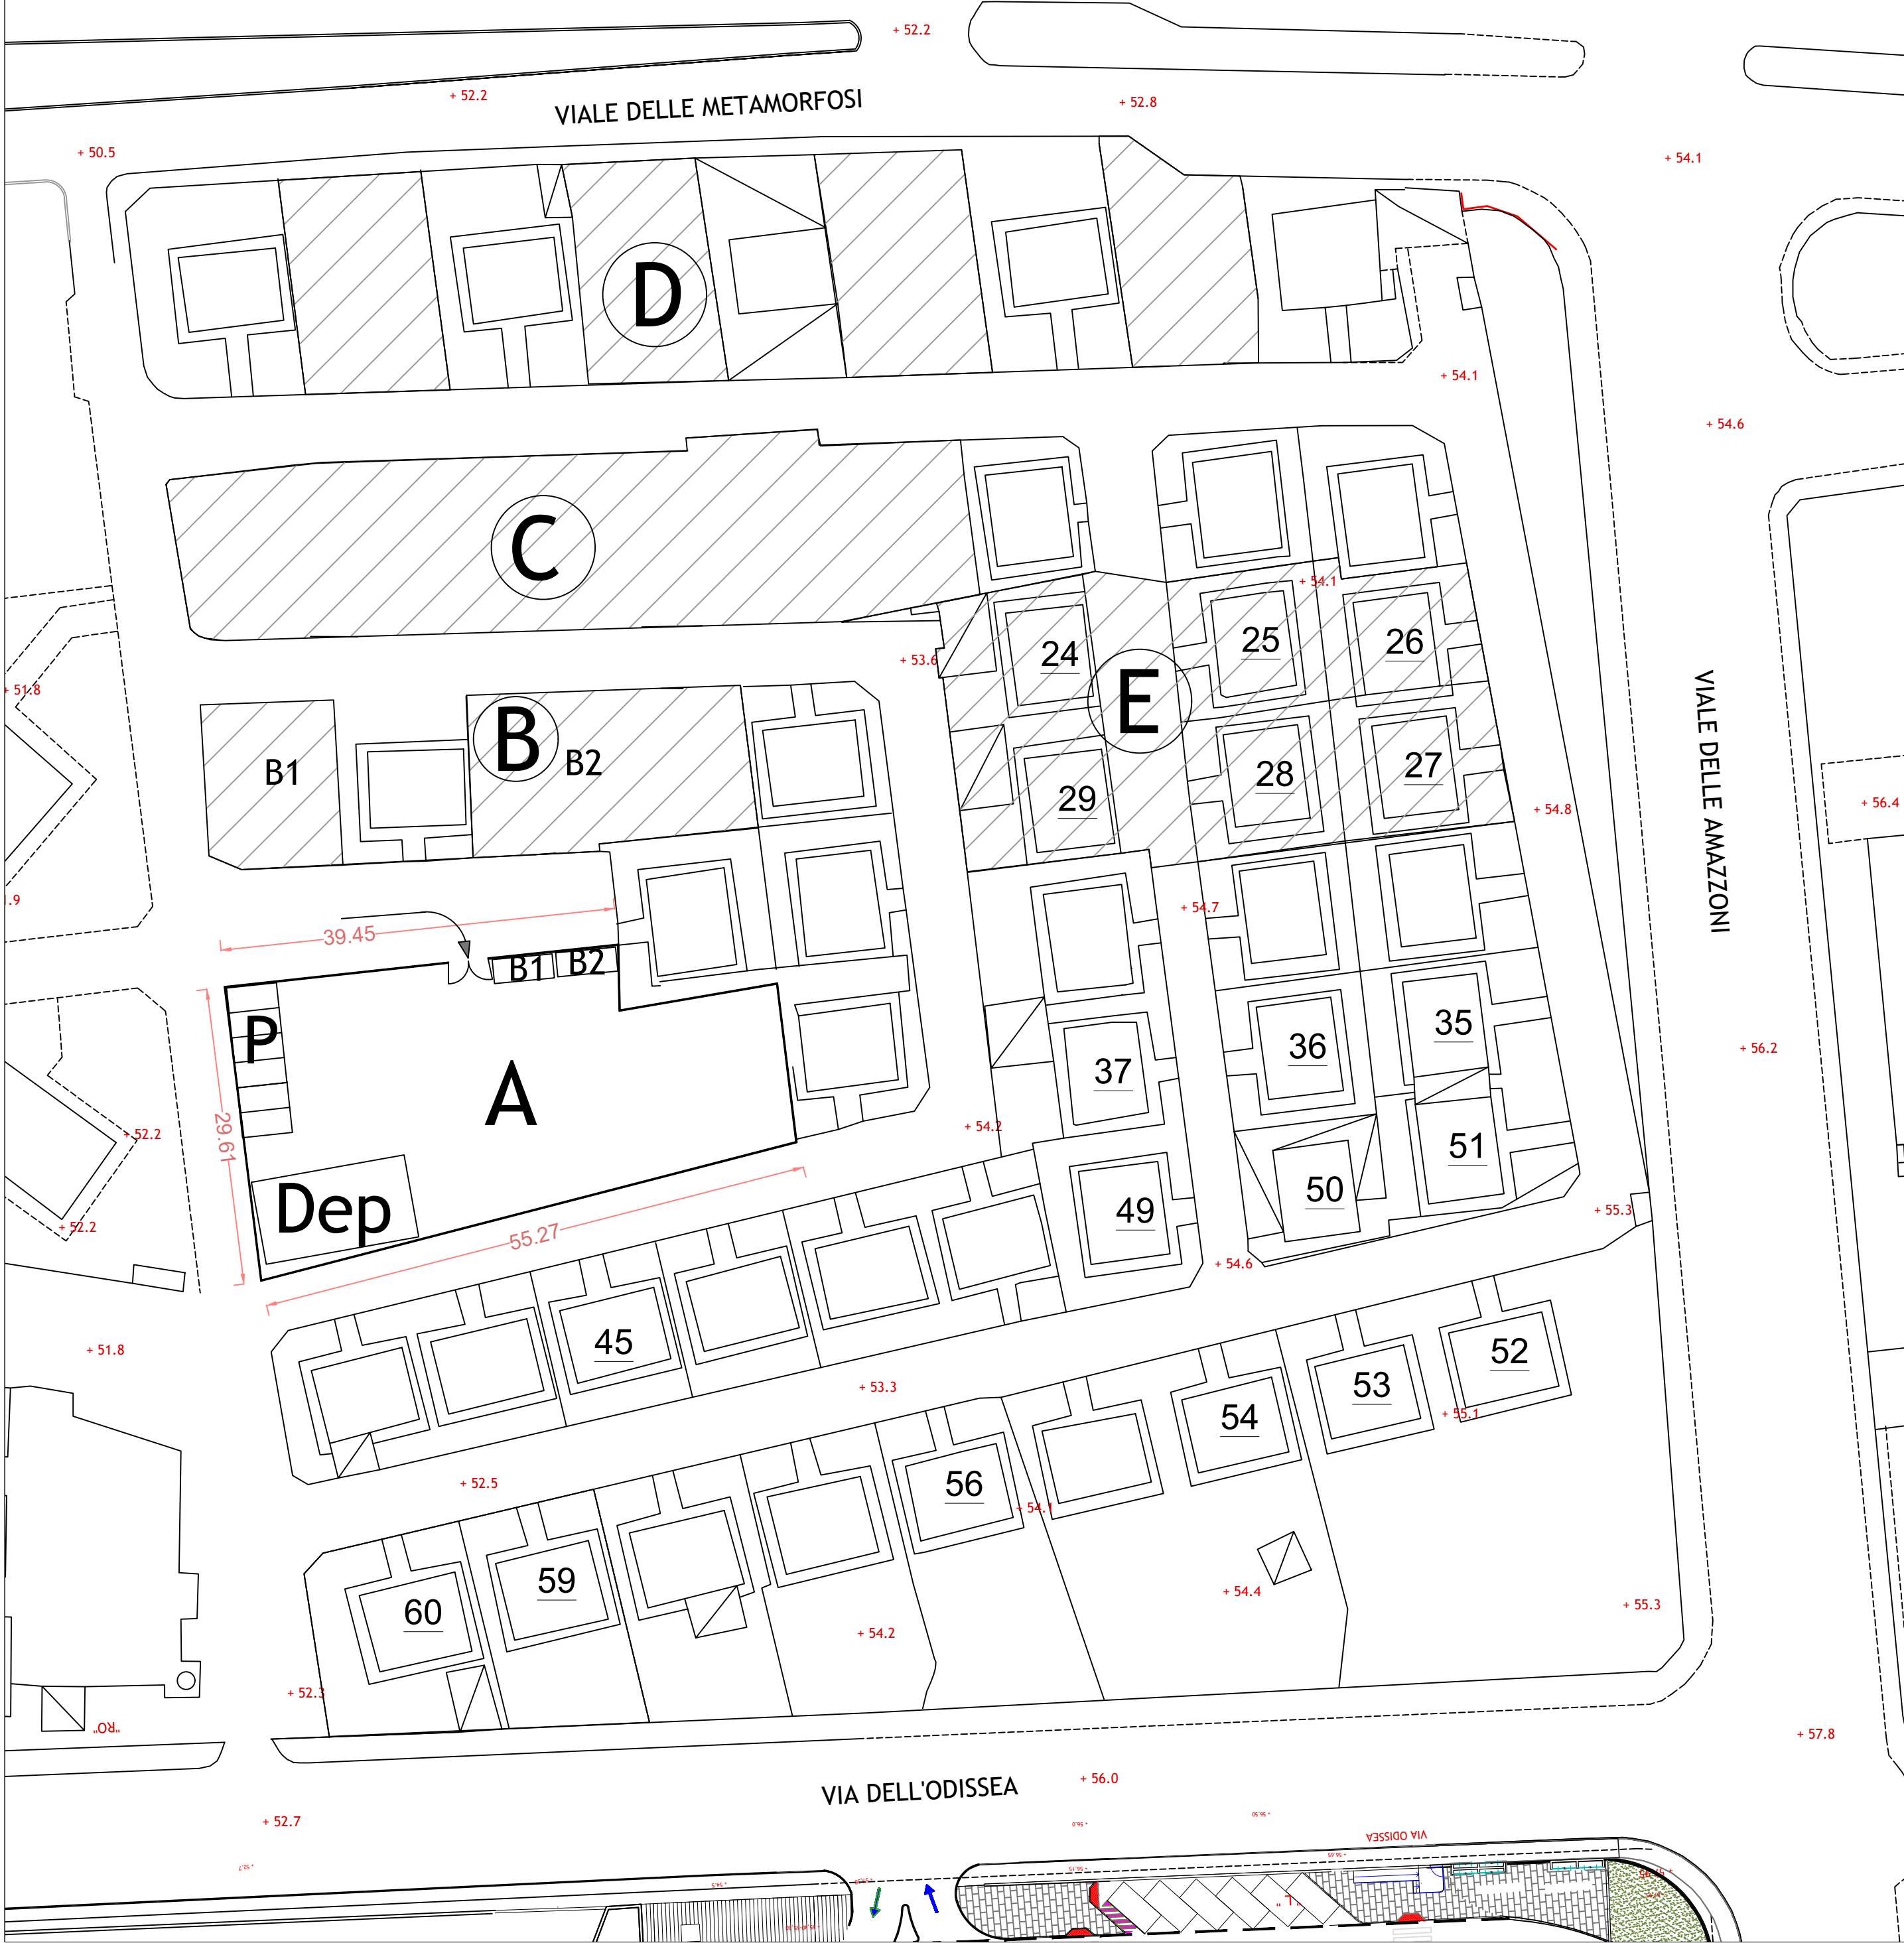

- I fase: allestimento cantiere nell'area A con recinzione in lamiera zincata nervata
II fase: Demolizione casette nn. 39, 40, 41, 42 e successivo ampliamento area di cantiere
III fase: Demolizione casette nn. 19, 21 e 22 - Area "B" di demolizione
IV fase: Demolizione casette nn. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 - Area "C" di demolizione
V fase: Demolizione casette nn. 2, 4 6 e 8 e rimozione lastre di amianto addossate alla recinzione tra la casetta n. 2 e la casetta n. 3 - Area "D" di demolizione
VI fase: Demolizione casetta nn. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 - Area "E" di demolizione
VII fase: Demolizione casette nn. 35, 36, 37, 49, 50, e 51 - Area "F" di demolizione
VIII fase: Demolizione casette nn. 52, 53, 54 e 56 - Area "G" di demolizione
IX fase: Demolizione casette nn. 45, 59 e 60 - Area "H" di demolizione
X fase: Sistemazione aree come da progetto e disallestimento cantiere Area "A"



COMUNE DI NAPOLI
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITÀ

**LAVORI DI BONIFICA, SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
A RIFIUTO DI 36 PREFABBRICATI AD UN PIANO DEL "CAMPO EVANGELICO"
IN VIALE DELLA METAMORFOSI, P.R.U. DI PONTICELLI SUB-AMBITO 7**

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: B63G10000600002



TITOLO:	Elab. n°	Emissione	Revisione	Revisione
Planimetria fasi di cantiere: Quinta e Sesta fase	32_Tav. 08.d			
	Scala: 1:500	Data		

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Paola Cerotto	Arch. Elisabetta Nulveni

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Arch. Concetta Montella
Ing. Laura Galeano
Geom. Luigi La Rocca
Coll.prog.: Arch. Valentina Grasso



Coordinatore della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione:
Geom. Luigi La Rocca

