

Comune di Napoli

Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica


CRONOPROGRAMMA


OGGETTO: Recupero e rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati al piano terra dell'ala occidentale di Castelnuovo a Napoli


COMMITTENTE: Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica

, 13/02/2014

Il Tecnico
(Arch. Valeria Palazzo)

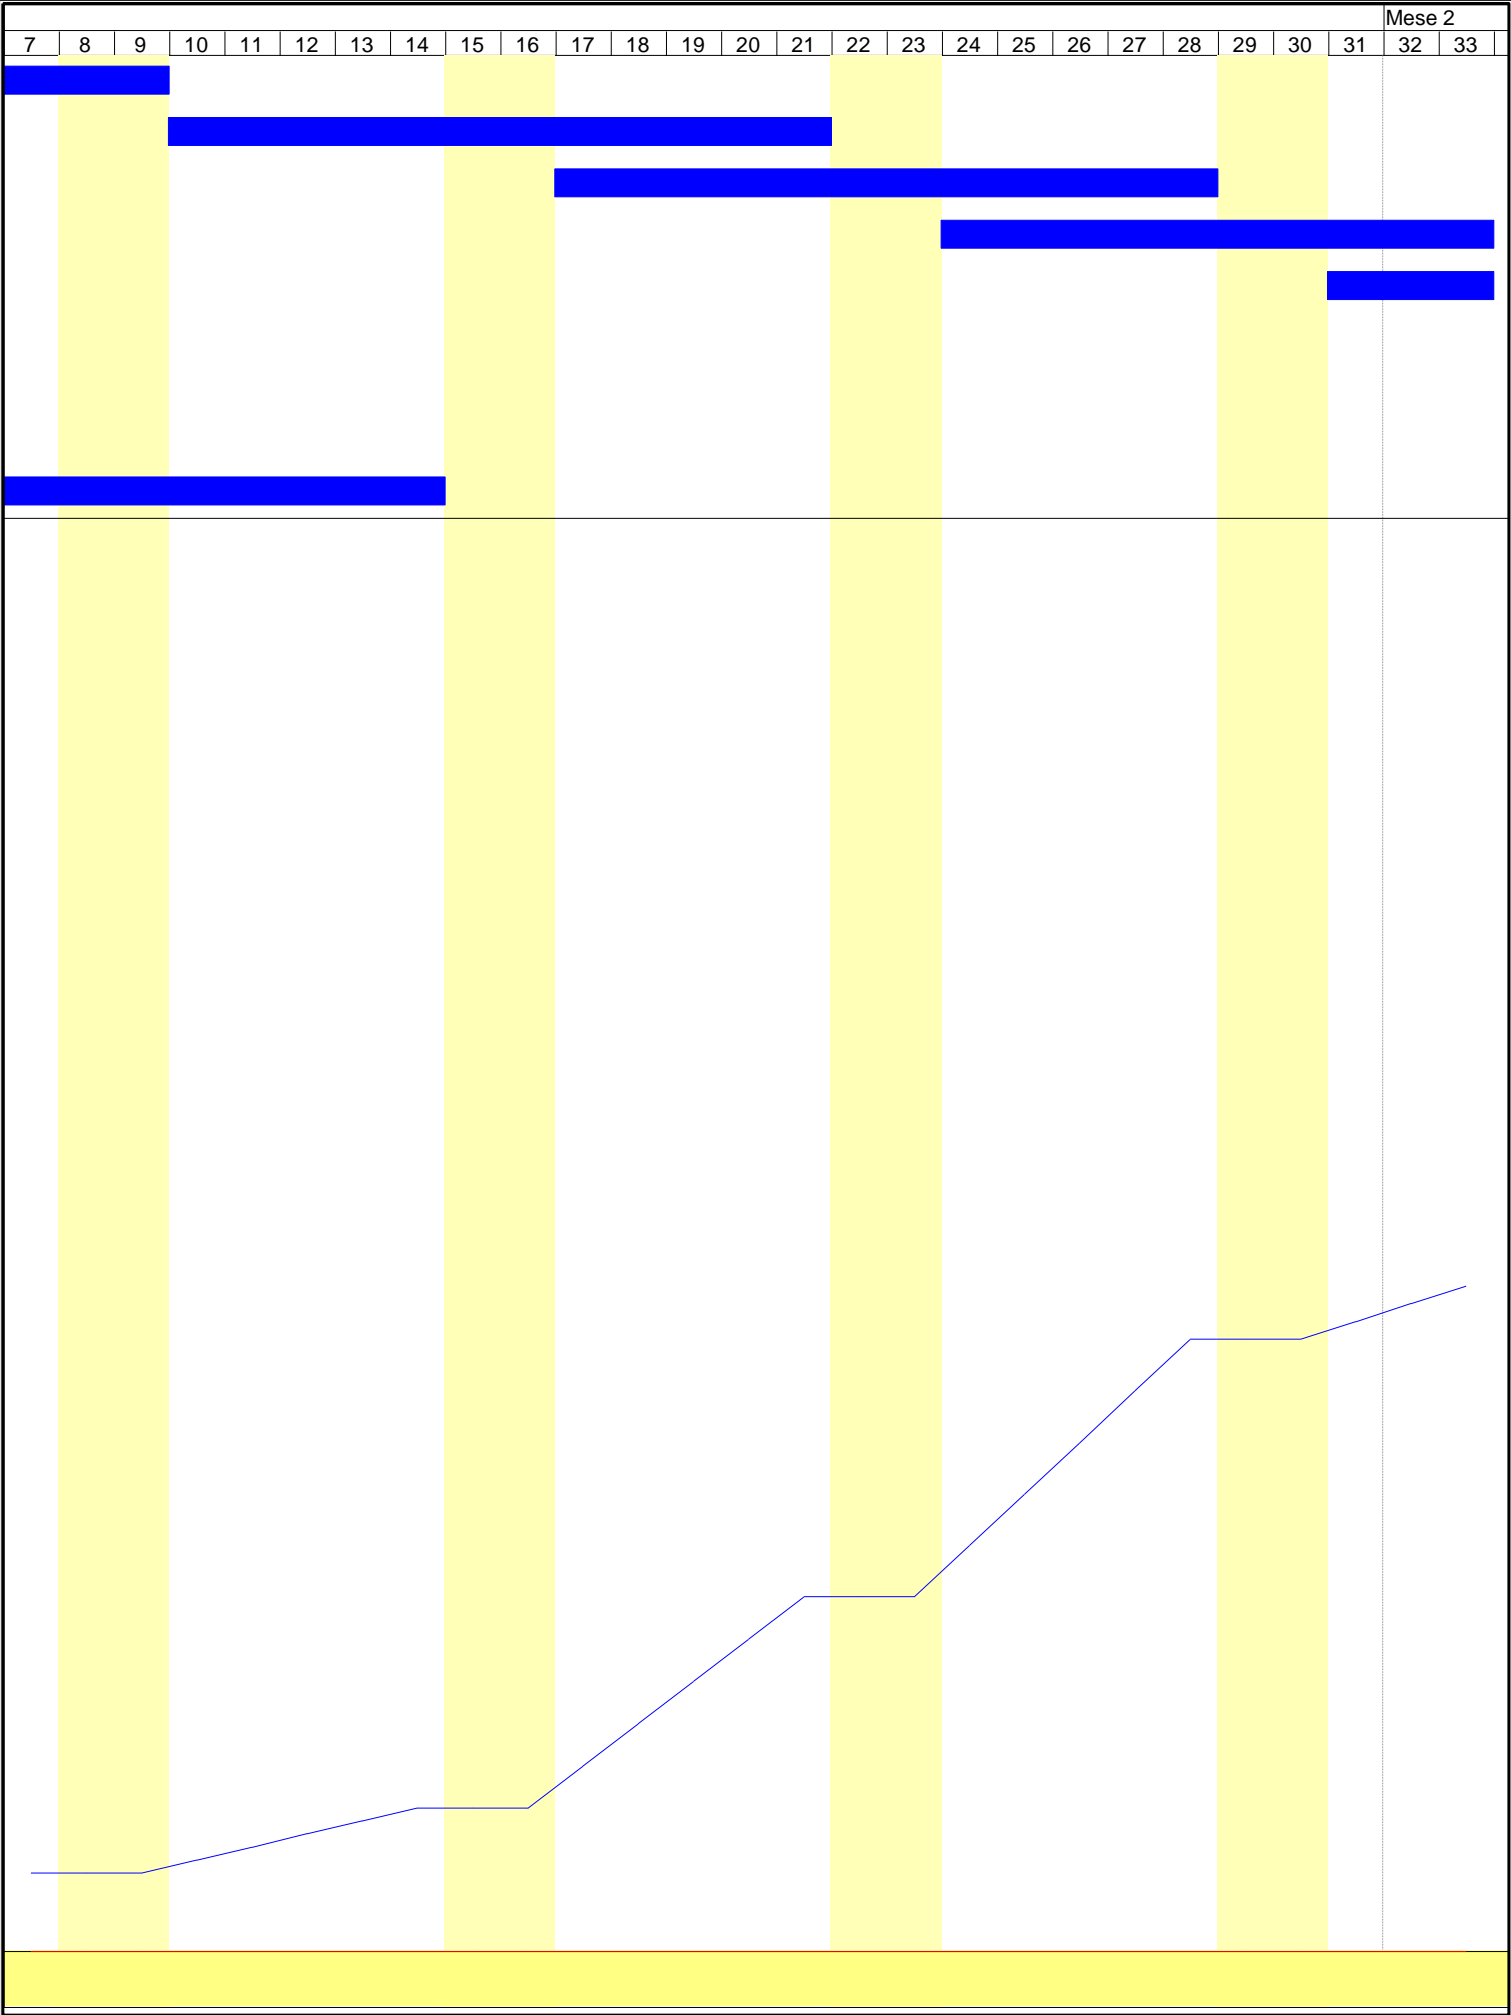

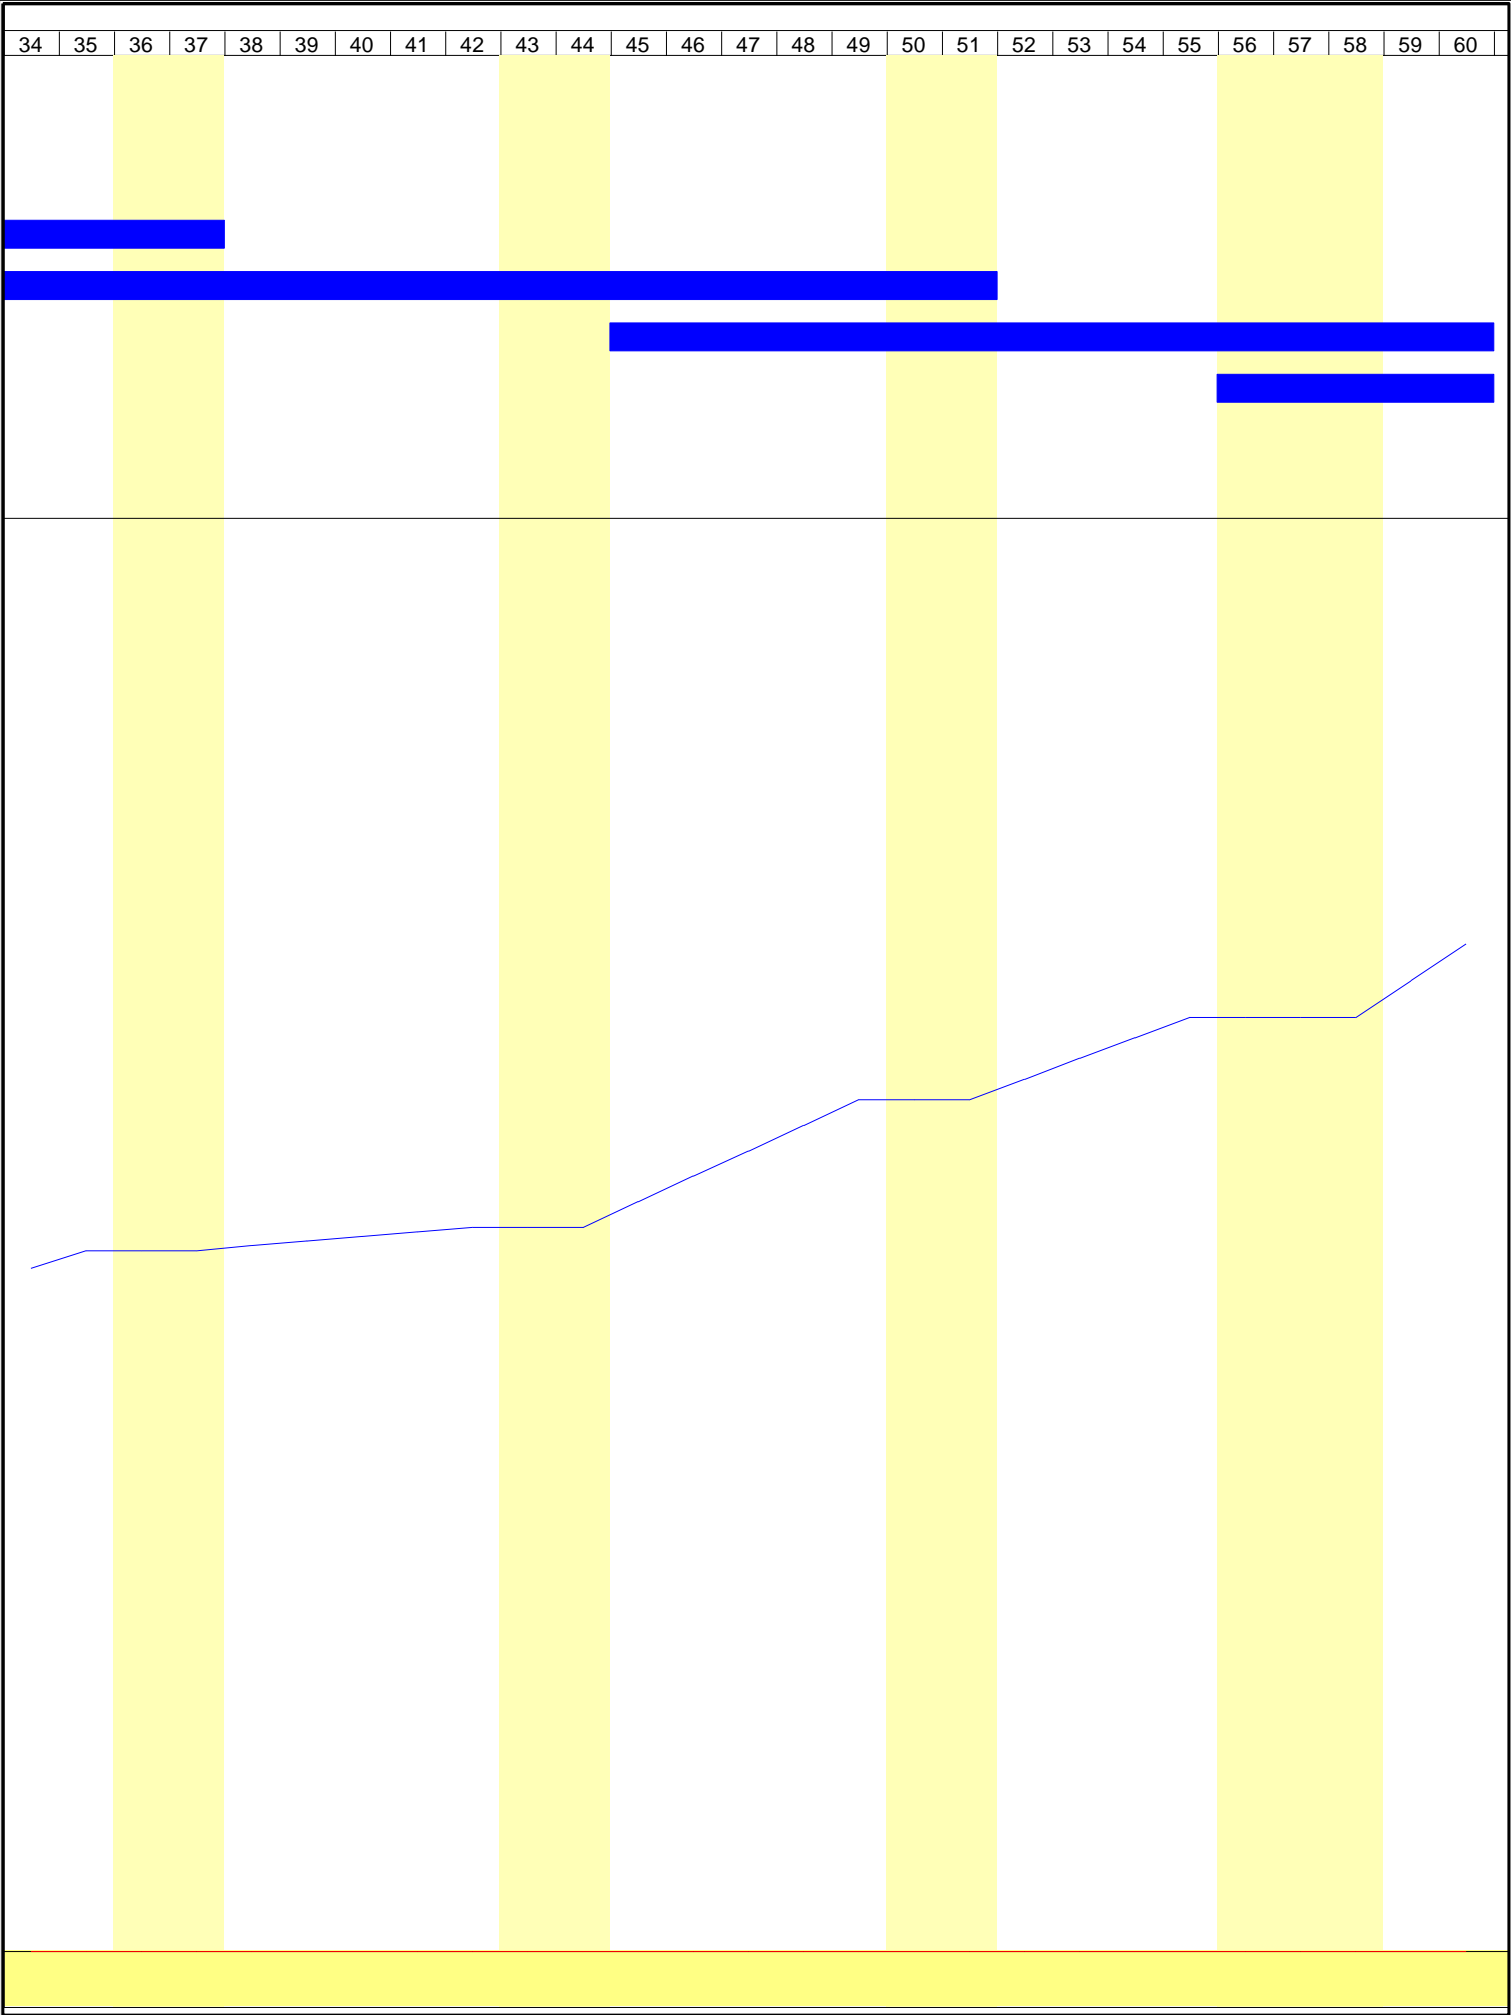

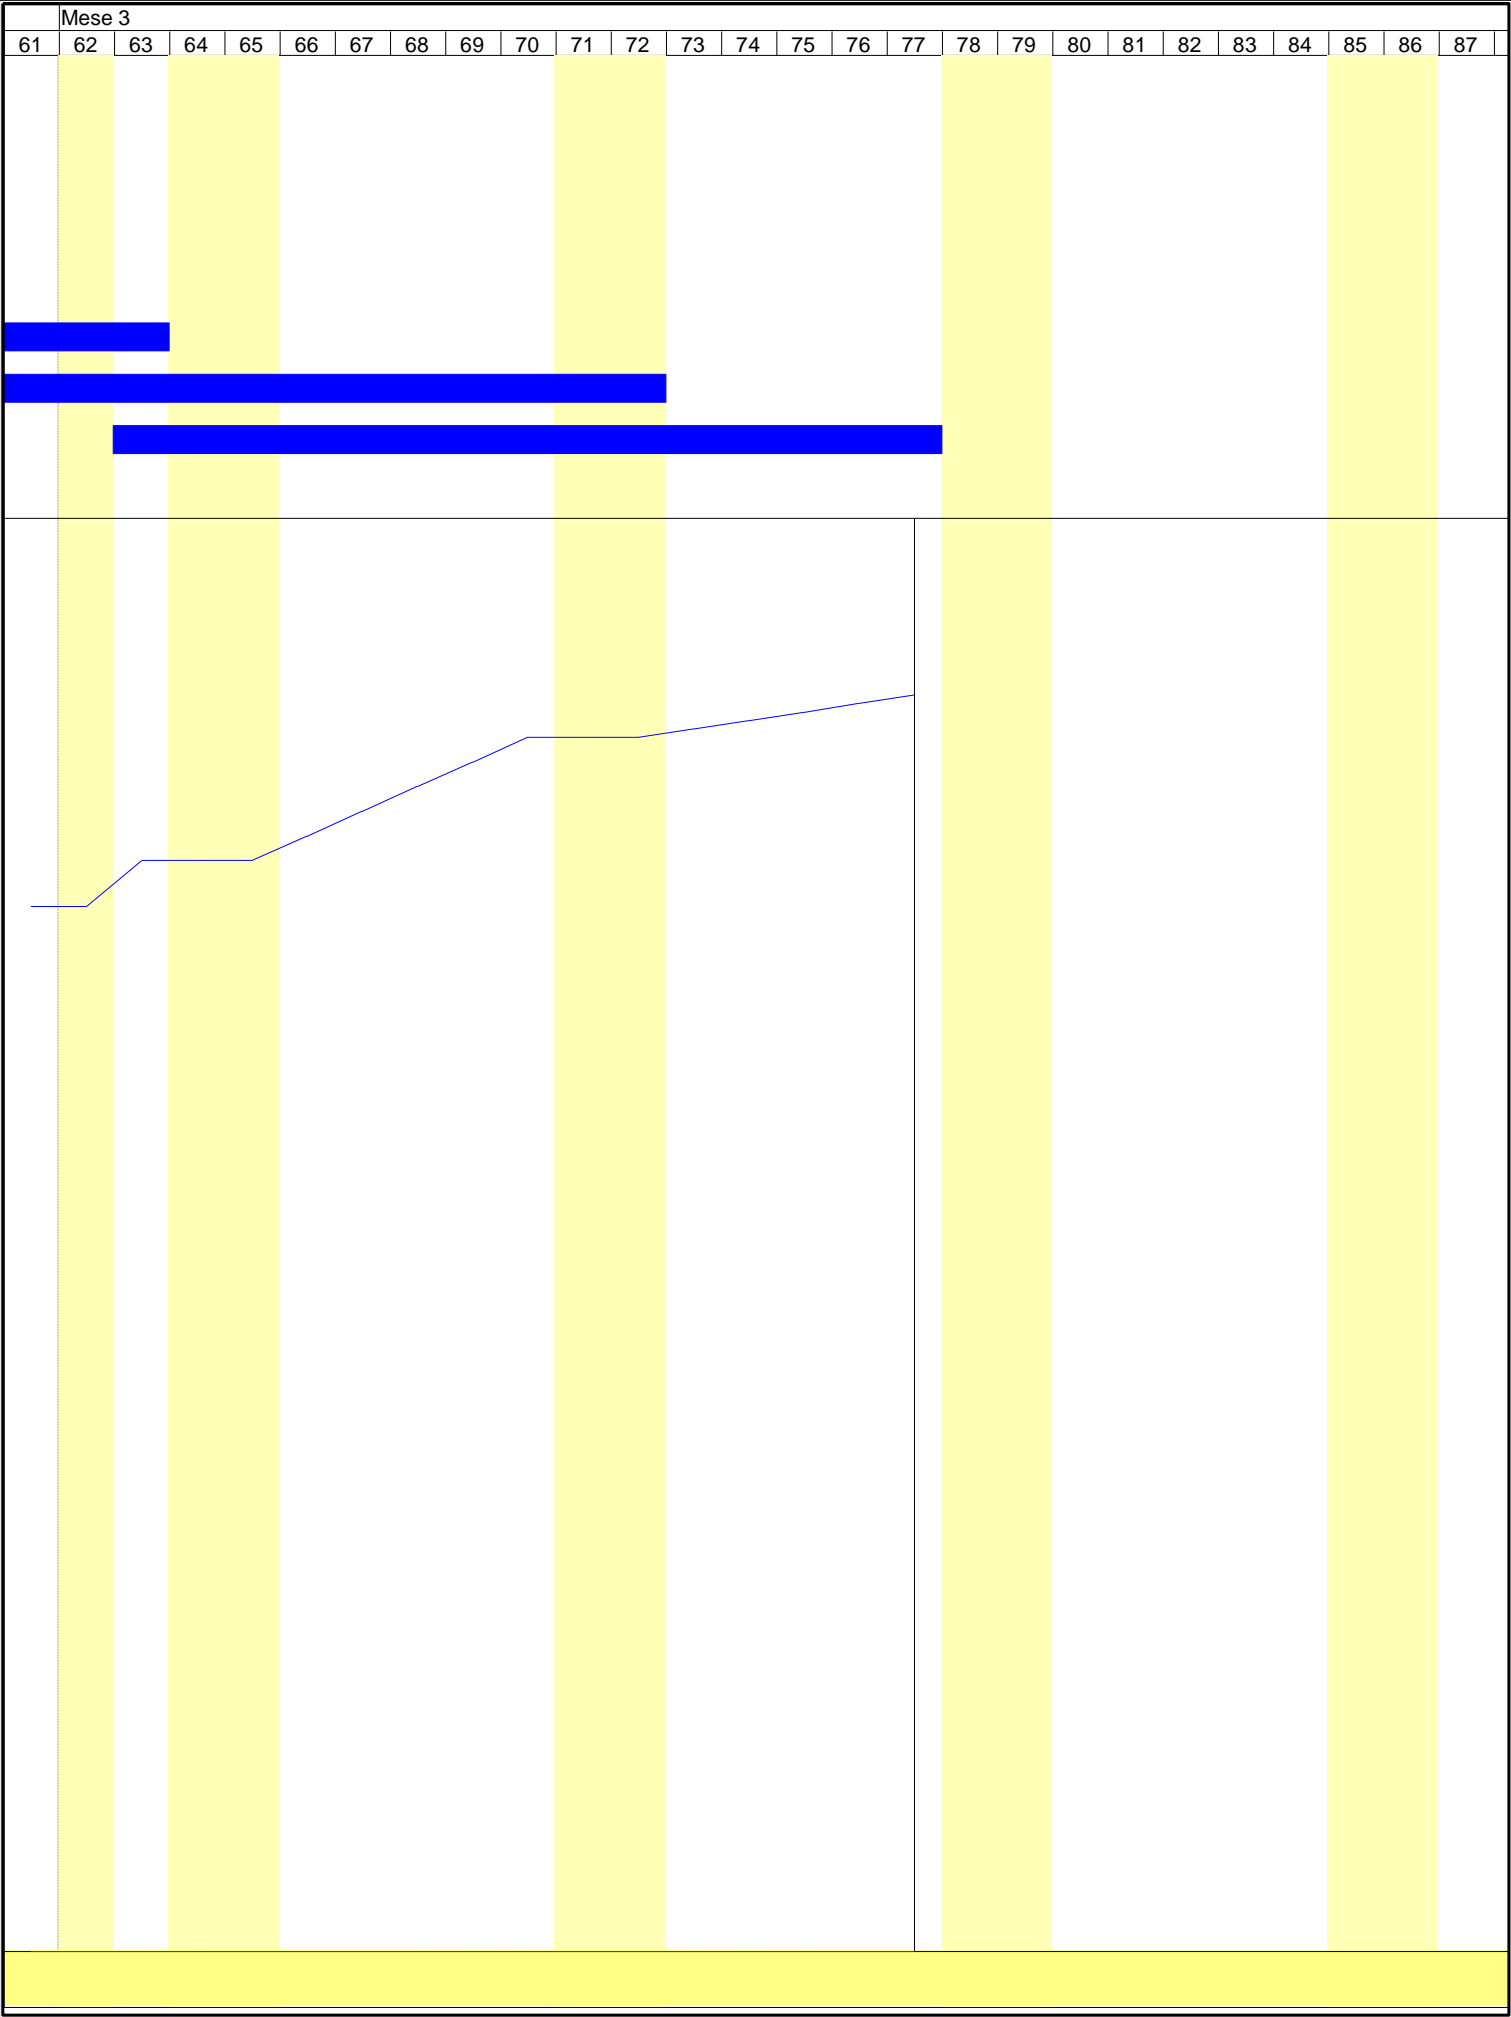

Comune di Napoli

Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica

Tabella Attività

OGGETTO: Recupero e rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati al piano terra dell'ala occidentale di Castelnuovo a Napoli

COMMITTENTE: Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica

, 13/02/2014

Il Tecnico
(Arch. Valeria Palazzo)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Demolizioni e rimozioni	1'690,91	2,72	1 gg	9 gg	5	9
Murature e tramezzature	2'037,93	3,28	10 gg	21 gg	10	12
Impianti elettrici e speciali	18'931,25	30,44	17 gg	28 gg	10	12
Impianto idrico e antincendio	6'499,63	10,45	24 gg	37 gg	10	14
Intonaci e rasature	3'464,76	5,57	31 gg	51 gg	15	21
Pavimentazioni e rivestimenti	13'352,59	21,47	45 gg	63 gg	13	19
Infissi e controsoffitti	7'245,62	11,65	56 gg	72 gg	9	17
Pitture interne	4'577,89	7,36	63 gg	77 gg	11	15
Opere esterne	4'390,66	7,06	1 gg	14 gg	10	14
<p>Data, 13/02/2014</p> <p>il Tecnico Arch. Valeria Palazzo</p>						

Comune di Napoli

Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Recupero e rifunzionalizzazione degli ambienti ubicati al piano terra dell'ala occidentale di Castelnuovo a Napoli

COMMITTENTE: Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica

, 13/02/2014

Il Tecnico
(Arch. Valeria Palazzo)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
3 gg	777,25	777,25	1,25
4 gg	777,25	1'554,50	2,50
5 gg	777,25	2'331,74	3,75
6 gg	777,25	3'108,99	5,00
7 gg	777,25	3'886,24	6,25
10 gg	642,86	4'529,10	7,28
11 gg	642,86	5'171,96	8,32
12 gg	642,86	5'814,82	9,35
13 gg	642,86	6'457,68	10,38
14 gg	642,86	7'100,54	11,42
17 gg	2'096,92	9'197,45	14,79
18 gg	2'096,92	11'294,37	18,16
19 gg	2'096,92	13'391,29	21,53
20 gg	2'096,92	15'488,21	24,90
21 gg	2'096,92	17'585,13	28,28
24 gg	2'543,09	20'128,21	32,37
25 gg	2'543,09	22'671,30	36,45
26 gg	2'543,09	25'214,39	40,54
27 gg	2'543,09	27'757,48	44,63
28 gg	2'543,09	30'300,56	48,72
31 gg	880,95	31'181,51	50,14
32 gg	880,95	32'062,46	51,55
33 gg	880,95	32'943,41	52,97
34 gg	880,95	33'824,35	54,39
35 gg	880,95	34'705,30	55,80
38 gg	230,98	34'936,28	56,18
39 gg	230,98	35'167,27	56,55
40 gg	230,98	35'398,25	56,92
41 gg	230,98	35'629,24	57,29
42 gg	230,98	35'860,22	57,66
45 gg	1'258,11	37'118,33	59,68
46 gg	1'258,11	38'376,43	61,71
47 gg	1'258,11	39'634,54	63,73
48 gg	1'258,11	40'892,65	65,75
49 gg	1'258,11	42'150,75	67,78
52 gg	1'027,12	43'177,87	69,43
53 gg	1'027,12	44'205,00	71,08
54 gg	1'027,12	45'232,12	72,73
55 gg	1'027,12	46'259,24	74,38
59 gg	1'832,19	48'091,43	77,33
60 gg	1'832,19	49'923,62	80,27
61 gg	1'832,19	51'755,81	83,22
63 gg	2'248,36	54'004,18	86,84
66 gg	1'221,24	55'225,42	88,80
67 gg	1'221,24	56'446,66	90,76
68 gg	1'221,24	57'667,90	92,73
69 gg	1'221,24	58'889,14	94,69
70 gg	1'221,24	60'110,38	96,65
73 gg	416,17	60'526,55	97,32
74 gg	416,17	60'942,72	97,99
75 gg	416,17	61'358,90	98,66
76 gg	416,17	61'775,07	99,33
77 gg	416,17	62'191,24	100,00
Data, 13/02/2014			
il Tecnico Arch. Valeria Palazzo			
